Informe de la Activación y operación del Equipo Estatal de Manejo de Incidentes del estado de Campeche en el Incendio Forestal Denominado 5 de febrero, Municipio de Champotón.

Estado de Campeche, abril de 2023

1.- Antecedentes:

El Centro Regional de Manejo del Fuego Sureste, mediante el uso del Sistema de Predicción de Peligro de Incendios Forestales (SPPIF) detecto un conglomerado de puntos de calor en terrenos del ejido 5 de Febrero, Municipio de Champoton, notificándolo vía correo electrónico a la PDF de la CONAFOR en Campeche, que atiende el Centro Estatal de Manejo del Fuego. Derivado de lo anterior, personal de la PDF realizo la verificación en campo con el apoyo de un DRON y verifico la existencia de un incendio forestal de magnitudes relevantes que se empezó a atender con recursos del ejido 5 de Febrero y de la CONAFOR que resultaban insuficientes, razón por la que se solicitó una sesión extraordinaria del GTO para el análisis de la situación, misma que se realizó el sábado 01 de abril y dada la complejidad y magnitud del incendio y la evolución que registraba en el SPPIF, se acordó proponer al Grupo Directivo del Comité Estatal de Manejo del Fuego de Campeche la activación del EEMI y la asignación de recursos adicionales, programando una sesión con el Grupo Directivo (GD) el domingo 02 de abril donde nuevamente se realizó el análisis de la situación y se autorizó por parte del GD la activación del EEMI para la atención del incendio 5 de Febrero.

El lunes 03 abril el GTO y el GD convocaron a los integrantes del EEMI a una reunión donde se les expuso la situación del incendio 5 de Febrero y se les notifico que serían asignados a la atención de dicho incendio, instruyéndoles que prepararan lo necesario para su movilización al terreno, entendimiento de la situación y participación en la sesión de transferencia del mando en el campamento establecido en la comunidad de Laguna Grande, Municipio de Escárcega, contando con el apoyo del CRMFS para brindar la asistencia técnica correspondiente

Presentación de la situación de incendios en el estado de Campeche por parte del GD y GTO a los integrantes del EEMI.

2. Reunión inicial del EEMI

En coordinación con la Promotoria de Desarrollo Forestal (PDF) y el GTO de Campeche, se planifico y organizó la primera reunión del EEMI el día 03 de abril en las instalaciones de LA PDF de la CONAFOR.

En dicha reunión, el Titular de la PDF explico los pormenores del incidente a los integrantes del EEMI y se analizó la organización propuesta, identificando las acciones preparatorias, así como los requerimientos logísticos del EEMI.

Organización propuesta y repaso de las principales funciones y responsabilidades de cada uno de los integrantes de la organización inicial del EEMI

- Comandante del Incidente (CI) Marcos Guzmán Sánchez/ Gaspar Palma
- Oficial de Información Pública (OIP) Julio León Olivera
- Oficial de Enlace (OE) William Naal Segovia
- Jefe de la Sección de Operaciones (JSO) Ermilo Chable / Manlio Chan/Teresa Morquecho
- Director de la Rama de Operaciones Aéreas (DROA) Ramiro J. Palomo
- Jefe de la Sección de Planificación (JSP) Rodolfo Chan Uc/Narciso Sagrero/Angel Ortega
- Especialista en SIG Eduardo Solís Aguilar
- Jefe de la Sección de Logística (JSL) José Junco Cruz/Jean James Euan Ortegón/Osvaldo Martinez
- Director de la Rama de Servicios (DRS) Tania Caamal Huicab

El mismo martes 04 de abril el titular del CRMFS convoco a los integrantes del EEMI a una reunión de trabajo en las instalaciones del CRMFS donde se revisaron los protocolos de actuación que se seguirían por el GTO, GD y los integrantes del EEMI, de acuerdo a los protocolos de SCI para asumir el mando e iniciar las acciones de manejo del incidente, incorporando a personal técnico del CRMFS como auxiliares y apoyos de las funciones de Planificación y Operaciones

3. Activación del EEMI y transferencia de mando

El día 04 de abril por la tarde, en sesión extraordinaria del GTO y GD, se concretó la trasferencia de mando del incendio Denominado 5 de febrero al CI del EEMI de Campeche, dicha transferencia se realizó en el campamento del personal que se asignó inicialmente al combate del incendio, en el ejido laguna grande, municipio de Escárcega. La transferencia la realizo la Mtra. Angélica Lara Pérez Ríos, Titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía del Gobierno del Estado de Campeche, en su carácter de representante del GD, estableciendo 3 prioridades: 1.Salvaguardar la vida, 2. Salvaguardar los bienes y 3.Salvaguardar los recursos naturales.

Sesión de GTO y GD en Laguna Grande, Escárcega para la transferencia de mando al EEMI

El CI Acepto el mando y presento a los integrantes del EEMI. El Puesto de Comando (PC), se estableció en las instalaciones de la Promotoria Local de la CONAFOR en Escárcega.

Organización Inicial del Equipo Estatal de Manejo de Incidentes de Campeche

Organigrama del Equipo Estatal de Manejo de Incidentes (EEMI)

Incendio Forestal 5 de febrero municipio de Champotón Cam.

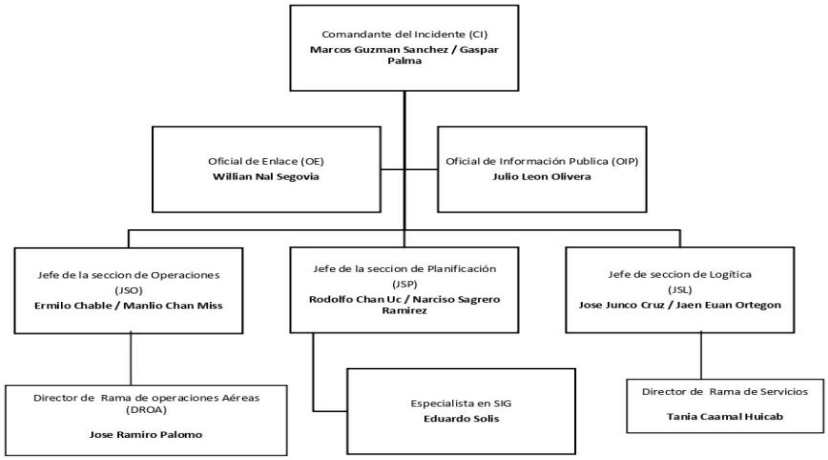

Como primera actividad posterior a la transferencia de mando, con la información recabada durante el proceso de entendimiento de la situación, el EEMI realizó su primera reunión de planificación y genero el primer Plan de Acción del Incidente.

PLAN DE ACCIÓN DEL INCIDENTE (PAI)

INCIDENTE:
Incendio Forestal 5 de Febrero

MUNICIPIO:
Champotón

ESTADO:
Campeche

PERIODO OPERACIONAL

FECHA: 6/04/2023 DE: 0600 A 1800 HRS

INFORMATIVA DEL PERÍODO OPERACIONAL
0545 HRS

INFORMACIÓN PRELIMINAR

Superficie estimada 1,657
Control 45%
Liquidación 20%

MENSAJE DE SEGURIDAD:
Mantener la Seguridad del Personal
Como Primera Consideración

Plan de Acción del Incidente (PAI) Página 1

4-. Desarrollo de la agenda del EEMI

A partir del día 05 de abril, hasta el 16 del mismo mes, el EEMI de Campeche asumió el mando en la ejecución del incendio forestal Denominado 5 de febrero, contando con la asesoría del CRMFS y desarrolló las funciones de manejo con base en el Sistema de Comando de Incidentes (SCI).

La primera actividad que se realizó en este periodo operacional fue la actualización del registro de combatientes asignados al incidente, utilizando los formatos de manifiesto de recursos.

Así mismo, se realizó el registro de todos los recursos asignados al incidente.

.

Registro de personal en el Incidente

Registro de unidad Médica del Incidente

Diariamente a partir del día 05 de abril se realizó la informativa de inicio de operaciones a las 0600 horas en el campamento establecido en el poblado de Laguna Grande, Escárcega, Campeche, donde se dio a conocer el PAI del periodo operacional, entregando las copias correspondientes a los integrantes de la organización.

Informativas de inicio de operaciones del EEMI Campeche

Después del despliegue de los recursos tácticos, el EEMI llevo a cabo una reunión de mando en el mismo campamento del Incidente, donde se repasaron las acciones del periodo operacional y se inició la integración de información para preparar el PAI del siguiente periodo operacional. El personal del CRMFS mantuvo observación permanente del proceso y emitió recomendaciones y sugerencias

Reunión de Mando

Posteriormente, cada integrante de la organización desarrollo las funciones correspondientes, y diariamente a las 13:30 horas, se realizaba una reunión de tácticas con la participación de los jefes de la sección de operaciones, planificación y logística en la que se analizaban los avances del periodo operacional, las asignaciones para el siguiente periodo y las necesidades logísticas.

Finalmente, a las 1800 horas, se realizaba la reunión de planificación con todos los integrantes del EEMI, en la que se actualizaba la información obtenida en la reunión de tácticas, generando los mapas actualizados y se confirmaban los objetivos, tácticas y estrategias a aplicar en el siguiente periodo operacional, obteniendo como producto de esta reunión el Plan de Acción del Incidente del siguiente periodo operacional.

AGENDA EQUIPO ESTATAL DE MANEJO DE INCIDENTES EEMI		
HORA	**ACTIVIDAD**	**RESPONSABLE**
06:00-06:15	Informativa del periodo operacional	EMI Campeche
10:30-11:00	Reunión de mando	CI
13:30-14:30	Reunión de tácticas y estrategias	JSO
18:00-18:30	Reunión de planificación	EMI Campeche

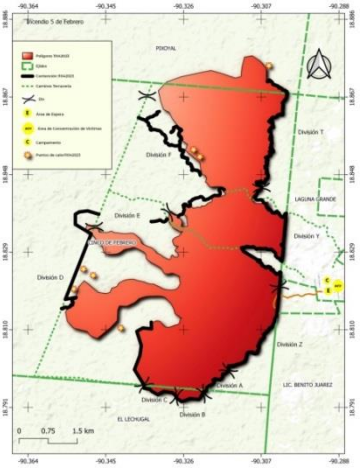

Polígono del incidente

Señaletica SCI utilizados en el EEMI

Reunión de Planificación con EEMI para la Actualización del polígono del Incidente y aprobación del PAI

Sección de Logística

La Sección de Logística desde el primer periodo operacional mantuvo una coordinación que permitió el manejo eficiente de los recursos obtenido a través de las gestiones del Grupo Directivo y Grupo Técnico Operativo para el incidente denominado 5 de febrero, asignando los recursos de acuerdo a las necesidades de requerimientos para la operación del equipo, alimentación, salubridad, comunicación y hospedaje del personal participante que opero dentro del Incidente.

Servicios Logísticos

Sección de operaciones

El Jefe de la Sección de Operaciones fue el responsable de la ejecución de las tácticas y estrategias en el terreno de acuerdo al Plan de Acción del Incidente, coordinando además la asignación de maquinaria pesada, sobrevuelos con DRON para la ubicación de brechas, puntos de calor y dirección de maquinaria pesada y se encargó de supervisar los trabajos en cada división del incendio Forestal Denominado 5 de febrero. De igual manera realizaba sus reuniones de campo con los supervisores de cada división, para coordinar los trabajos asignados de acuerdo al PAI

Operaciones en el incendio forestal 5 de febrero

Sobrevuelos de Reconocimiento

Durante la activación del EEMI, se gestionaron 2 sobre vuelos de reconocimiento, para recorrer el perímetro del incendio forestal Denominado 5 de febrero, así como visualizar los frentes activo, para fortalecer la toma de decisiones en la definición de las tácticas y estrategias de combate

Sobre vuelo de reconocimientos en el incendio 5 de febrero

Reunión de tácticas y estrategias

Diariamente se realizaba la reunión de tácticas y estrategias. Con la información obtenida se actualizaba el mapa del incidente y se acordaban los avances y asignaciones para los siguientes periodos operacionales.

Reunión de tácticas y estrategias con el jefe de la sección de operaciones

Reunión de Planificación:

Durante esta etapa con el apoyo del CRMFS se realizaron 12 reuniones de planificación, para obtener 12 PAI en los que se actualizaban los objetivos, tácticas, estrategias, asignaciones y procedimientos de manejo del incidente.

Apoyo del auxiliar de Planificación del CRMFS al Jefe de la Sección de Planificación del EEMI Campeche

Reuniones con el GD y GTO para seguimiento del incidente

Durante la activación del Equipo de Manejo de Incidentes, el GTO y el GD gestionaron 4 reuniones de seguimiento en las instalaciones del Tecnológico Nacional de México CAMPUS ESCÁRCEGA (TECNM CAMPUS ESCÁRCEGA) donde el CI del EEMI presento el análisis de la situación y los avances de control del incendio denominado 5 de febrero, así como las tácticas y estrategias utilizadas, donde además expuso las necesidades logísticas y de recursos adicionales para el logro de los objetivos.

Reunión con el GD y GTO para seguimiento del incidente

Requerimientos entregados por el GD y GTO al EEMI

Entrega del incendio al ejido 5 de febrero para su vigilancia

Derivado de los avances en el control del incidente, el día 16 de abril a las 1630 horas en las instalaciones del Tecnológico Nacional de México CAMPUS ESCÁRCEGA (TECNM CAMPUS ESCÁRCEGA), el GTO y el EEMI realizaron la evaluación de la situación a través de un resumen ejecutivo de los trabajos realizados. Con un avance del 100 % de control y 80 % de liquidación, el GTO y el GD dio por concluida la activación del EEMI y por conducto de la Mtra. Angélica Lara Pérez Ríos, Titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía y del Dr. Carlos Alejandro Tucuch Cauich, titular de la Promotoria de Desarrollo Forestal de la CONAFOR en Campeche, realizaron la entrega de los trabajos realizados en el incendio a las autoridades ejidales del ejido 5 de Febrero, haciendo entrega de copia de los Planes de Acción del incidente formulados, manteniendo los recursos necesarios gestionados por el GTO para concluir los trabajos de liquidación. Asistieron los integrantes del comisariado ejidal del ejido 5 de febrero, la totalidad de técnicos que integraron el EEMI, los integrantes del GTO y del GD del Comité Estatal de Manejo del Fuego de Campeche, concluyendo de esta manera la operación del EEMI.

Entrega recepción del incendio forestal al ejido 5 de febrero

Reunión después de la acción (RDA) y evaluación de desempeño

El día 17 de abril, con la participación del EEMI y el equipo del CRMFS se realizó la Reunión Después de la Acción (RDA) en las instalaciones del Tecnológico Nacional de México CAMPUS ESCÁRCEGA (TECNM CAMPUS ESCÁRCEGA), identificando en plenaria los temas críticos sobre los que se respondieron las preguntas ¿Que se Planeó?, ¿Qué fue lo que ocurrió?, ¿Por qué sucedió? y ¿Qué podemos hacer para mejorar?, enfocando y reorientando siempre que fue necesario, las participaciones en el "Que" y no en el "Quien", documentando el proceso con un resumen impreso que fue firmado por los participantes.

Una vez concluida la RDA, se procedió a la integración de las evaluaciones de desempeño demostrado durante la operación del EEMI, siguiendo la cadena de mando, se evaluaron las posiciones que mantuvieron bajo su supervisión de acuerdo al formato considerado por el SCI

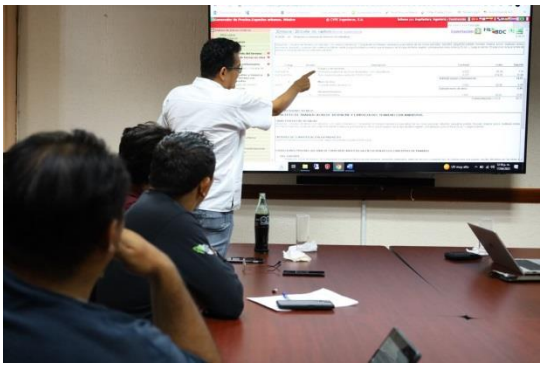

RDA y Evaluación de Desempeño

Desmovilización

El día 17 de abril a las 1500 horas se inició la desmovilización de los integrantes del EEMI, concluyendo la misma el día 18 de abril de 2023, sin novedad.

Conclusiones y Recomendaciones

El EEMI fue activado por el GTO de Campeche para atender el incendio forestal 5 de febrero bajo un esquema de coordinación interinstitucional conducido por el GTO y el GD del Comité Estatal de Manejo del Fuego de Campeche.

Los protocolos de coordinación interinstitucional aplicados permitieron concretar la activación del EEMI con el respaldo del Grupo Directivo del Comité Estatal de Manejo del Fuego de Campeche y su GTO, obteniendo bajo este esquema el soporte logístico requerido. Se recomienda fortalecer los esquemas de coordinación en las diferentes instancias que intervienen en el Programa de Manejo del Fuego.

El GTO y el GD de Campeche, aplico los protocolos de Transferencia de Mando y mantuvo el seguimiento a los trabajos del EEMI, asignando recursos indispensables para la atención del incidente, realizando finalmente la entrega del incidente bajo control al ejido 5 de Febrero, aplicando los protocolos del SCI con las dependencias que conforman el GTO. Se recomienda replicar estos procesos durante la activación de Equipos de Manejo de Incidentes en las distintas entidades del país.

La sección de operaciones desarrollo sus actividades con 2 jefes de sección: Uno en gabinete y otro en el terreno en cada periodo operacional, lo que permitió que las tácticas y estrategias que se plantearon en el PAI, fueran entendidas, realizadas y ajustadas de acuerdo a las condiciones en del incendio, retroalimentando de manera eficiente en el proceso de planificación que se realiza en el Puesto de Comando.

Los resultados de la RDA se documentaron de acuerdo a los protocolos del SCI y serán expuestos ante el GTO para su atención procedente.

Anexos

1. 12 copias de planes de acción del incidente
2. Copia de minutas de activación del EEMI, transferencia de mando, seguimiento del GTO y GD y de entrega del incidente al ejido 5 de Febrero.
3. Copia de bitácoras de unidad de las posiciones activadas del EEMI
4. Copia de la RDA
5. Copia de las evaluaciones de desempeño de los integrantes del EEMI
6. Estimación de costos de atención al incidente.
